



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Keşif artış işlemi)
İş Akış Şeması

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2

Sorumlular	İş Akışı Adımları	İlgili Dokümanlar	
1-İlgili Mühendis/ Mimar 2-Yüklenici	<p style="text-align: center;">Keşif artışına konu işin ortaya çıkması</p>	<p>Yüklenicinin talebi ya da tespitini kapsayan başvuru dilekçesi ya da ilgili mühendis/mimarın resen yapmış olduğu keşif artışına konu olabilecek iş/işlerin tespiti</p>	-
1-İlgili Mühendis/ Mimar 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	<p style="text-align: center;">Keşif artışı uygun mu?</p>	<p>Keşif artışına konu olacak işin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin incelenerek karar verilmesi</p>	-
1-İlgili Teknik Personel	<p style="text-align: center;">Keşif artışına konu işin projesine işlenerek metrajının çıkarılması</p>	<p>Keşif artışına konu işin ilgili projesine işlenmesi ve bu proje üzerinden, yapılacak imalatların miktarlarının belirlenmesi</p>	Revize uygulama projesi, metraj cetveli -
1-İlgili Teknik Personel 2-Yüklenici	<p style="text-align: center;">Yeni birim fiyatlar yüklenici ile tespit edildi mi?</p>	<p>Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak tespit edilmesi, fiyatlar konusunda uyumsuzluk olması durumunda ise anlaşmazlık tutanağı düzenlenmesi</p>	Yeni Fiyat Tutanağı / Anlaşmazlık Tutanağı
1-Daire Başkanı	<p style="text-align: center;">Anlaşmazlık tutanağının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilmesi</p>	<p>Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak tespit edilmesi sırasında ortaya çıkan uyumsuzluk neticesinde düzenlenen anlaşmazlık tutanağının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilmesi</p>	Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilecek fiyat tespit talebi yazısı ve eki anlaşmazlık tutanağı
1-İlgili Teknik Personel 2-Daire Başkanı	<p style="text-align: center;">Yeni fiyat tutanağının düzenlenmesi</p>	<p>Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak ya da Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca tespit edilmesi neticesinde yeni fiyat tutanağının düzenlenmesi</p>	Yeni fiyat tespit tutanağı
	<p>1</p> <p>2</p>		

Hazırlayan

Çetin KILIÇ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

Sistem Onayı

Genel Sekreter V.


Yürürlük Onayı

Rektör Yardımcısı



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Keşif artış işlemi)
İş Akış Şeması

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	2/2

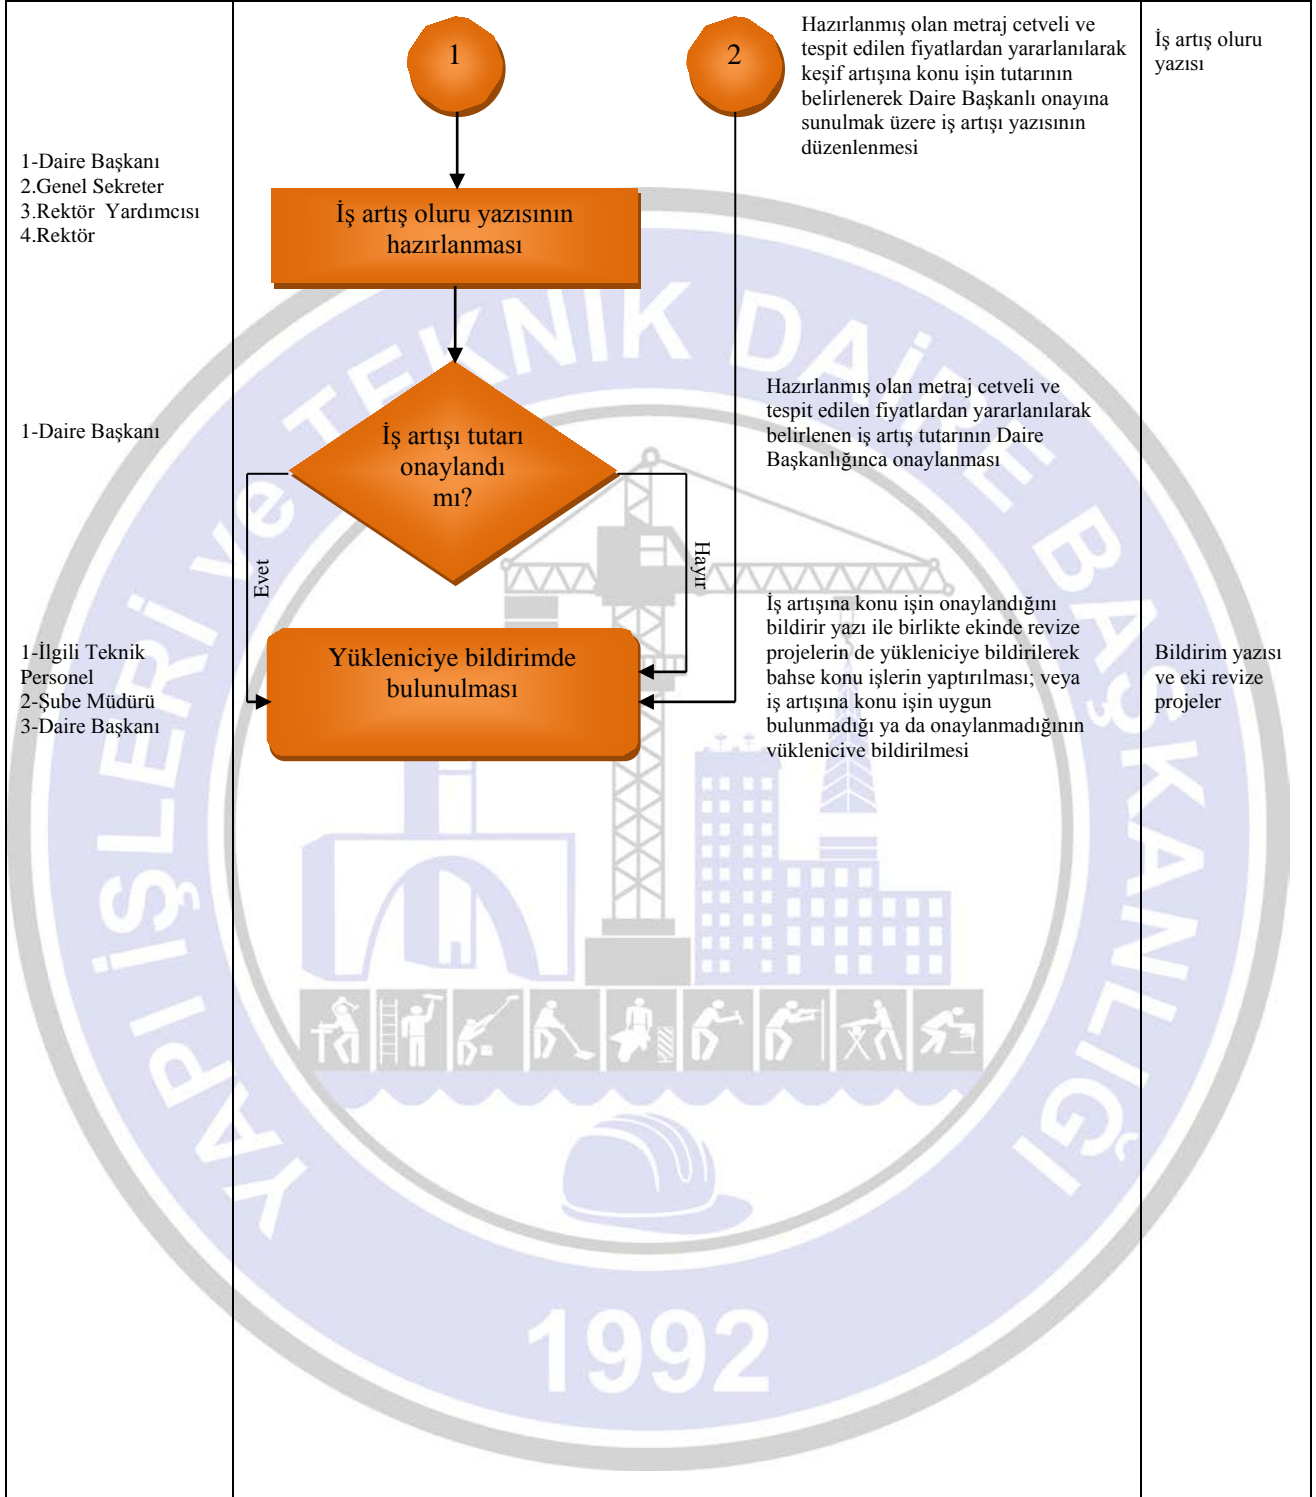

Hazırlayan Çetin KILIÇ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.	Sistem Onayı Genel Sekreter V.	Yürürlük Onayı Rektör Yardımcısı
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------
